



a **kiwa** company

Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61644862/00/NL/000

Origineel



Uw klantnummer: 100539255

Contractnummer: 2233353/41000

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Noordstraat 1, 8647 Lo-Reninge



Uitgevoerd op:

19/02/2026 08:28 - 14:39



Uitgevoerd door: TOM DELAVIE (3955)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Eigenaar

Naam, Voornaam	Stad Lo-Reninge
Adres	Markt 11 - 8647 Lo-Reninge

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam	Merlevede Lukas
Adres	Bellestraat 114, 8908 Vlamertinge

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 440 481
Adres	Noordstraat 1, 8647 Lo-Reninge
EAN-code	541448820068272225
Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1SAG1100503839
Index 1.8.1 verbruik dag	2476
Index 1.8.2 verbruik nacht	2632
Toelichting installatie	Bestaande woning
Gecontroleerde installatie	- Wooneenheid
Type installatie	Huishoudelijke installatie

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 57 11 contact@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Uitgiftedatum: 19/02/2026

1 / 13

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.5. Controlebezoek
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020
Aardverbindingssysteem	TT
Toegepaste afwijkingen	- Deel 8


GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	40
Type van de algemene schakelaar	- Differentieelscheidingsschakelaar
Doorsnede leiding voeding bord (mm ²)	2x16
Voedingsleiding - Type	VOB

BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: A


Plaats van opstelling	Inkom
Aantal kringen	16

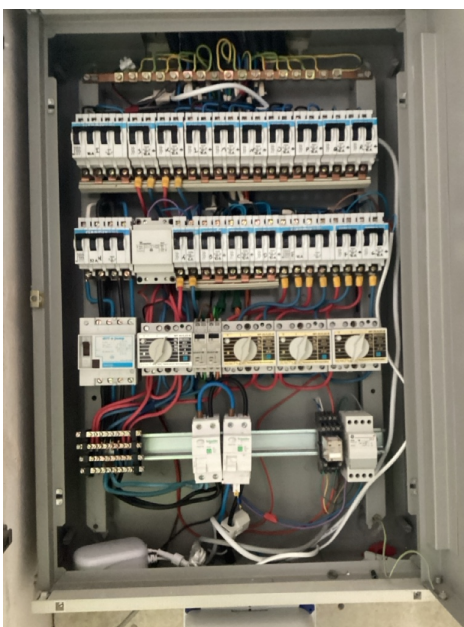

(Elektrisch bord - binnenkant)

LS-bord: B

Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	10

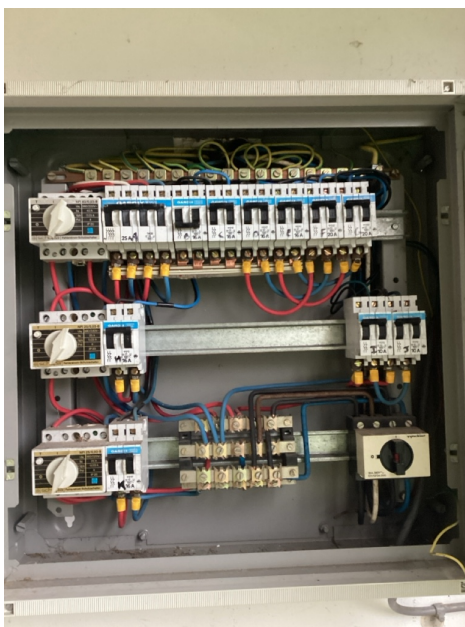

(Elektrisch bord - binnenkant)

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema's	Referentie	Lukas Merlevede
Eendraadsschema's	Versie	19/02/2026
Situatieplannen	Referentie	Lukas Merlevede
	Versie	19/02/2026

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing / nazicht niet mogelijk
Beschermingsmaatregelen rechtstreekse aanraking	OK
Beschermingsmaatregelen onrechtstreekse aanraking	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden	OK
Informatie inhoud controle	- Definitieve verlichtingsarmaturen: nog niet (overal) geïnstalleerd

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.

Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Verticaal in de grond gedreven geleiders / staven / pennen
Meting spreidingsweerstand	Meting waarde van Re (Ohm) is mogelijk
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	19.9
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	0.69

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

Installatie

Bijkomende vaststelling binnen het kader van deze controle

- Kookfornuis niet geplaatst (S1) Diff 300 + 30 mA op kop installatie nemen de functie van de andere oude differentieels over.

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 19/2/2051.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.




Ir F. Dewint
Directeur Generaal


VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

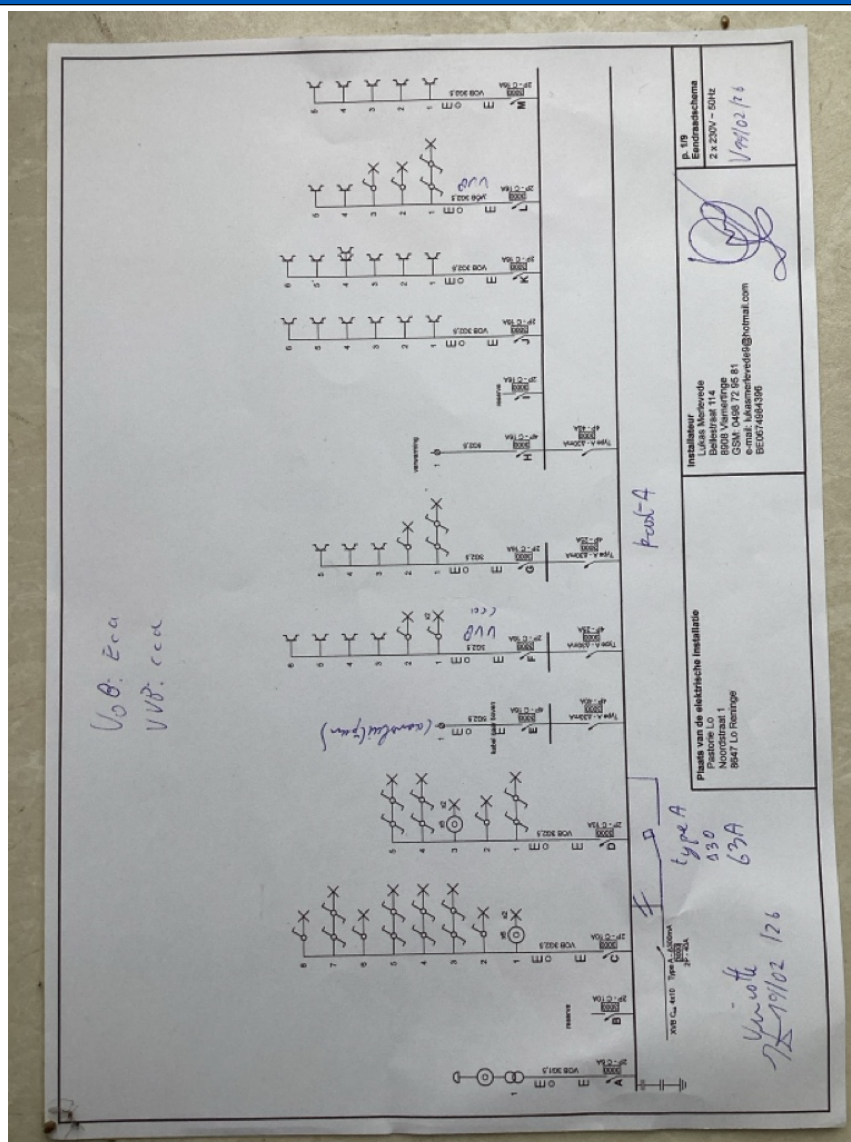

Eendraadsschema's

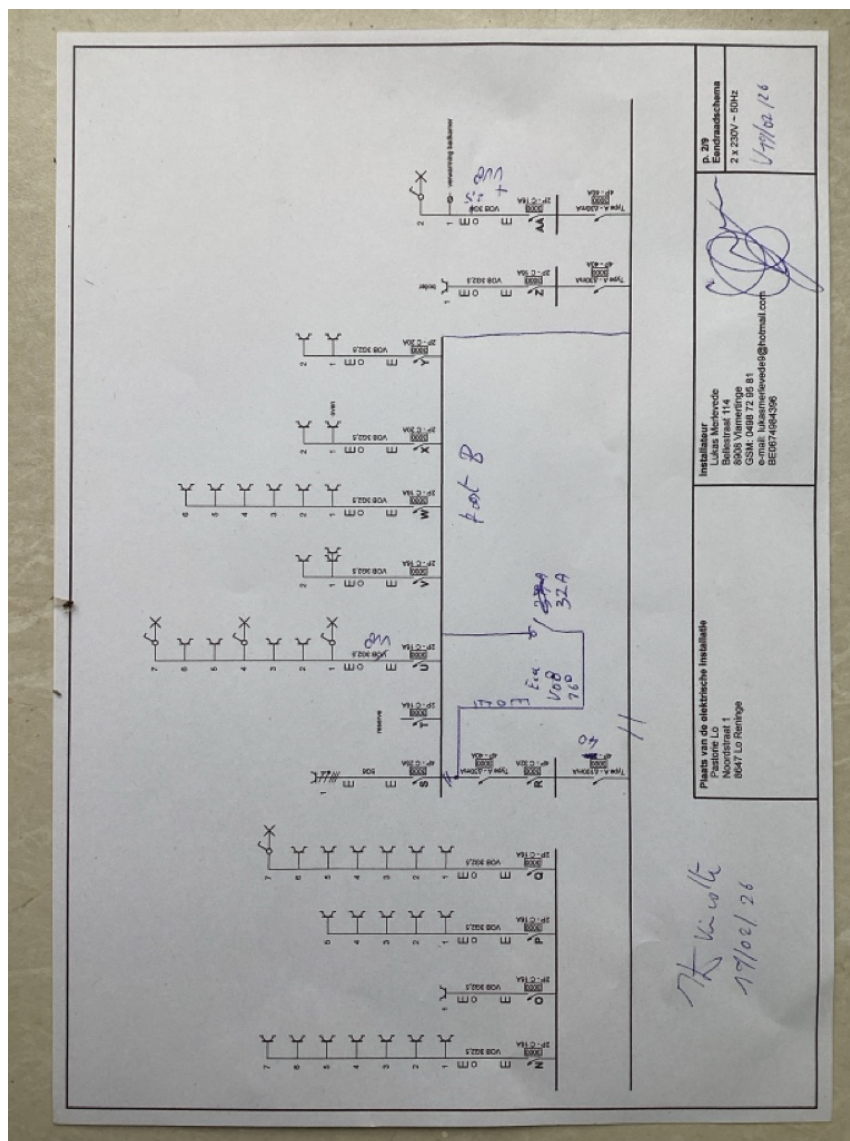


Eendraadsschema's


p. 3/9 Eendraadsschema 2 x 230V - 50Hz 17/02/26	<i>[Handwritten Signature]</i> Installateur J. van der Velden Bosveld 114 6903 Vamerlinge GSM: 068 72 95 81 e-mail: j.vanderelden@hotmail.com BE054904395	Plaats van de elektrische installatie Huis van de heer Postbus 1 8547 LO Rieringe
--	---	--

Hand-drawn electrical wiring diagram. It shows a power supply (230V, 50Hz) connected to a switch (S) and a light fixture (L). The diagram includes labels for 'AC' and 'AB' and a note '17/02/26'.


Eendraadsschema's

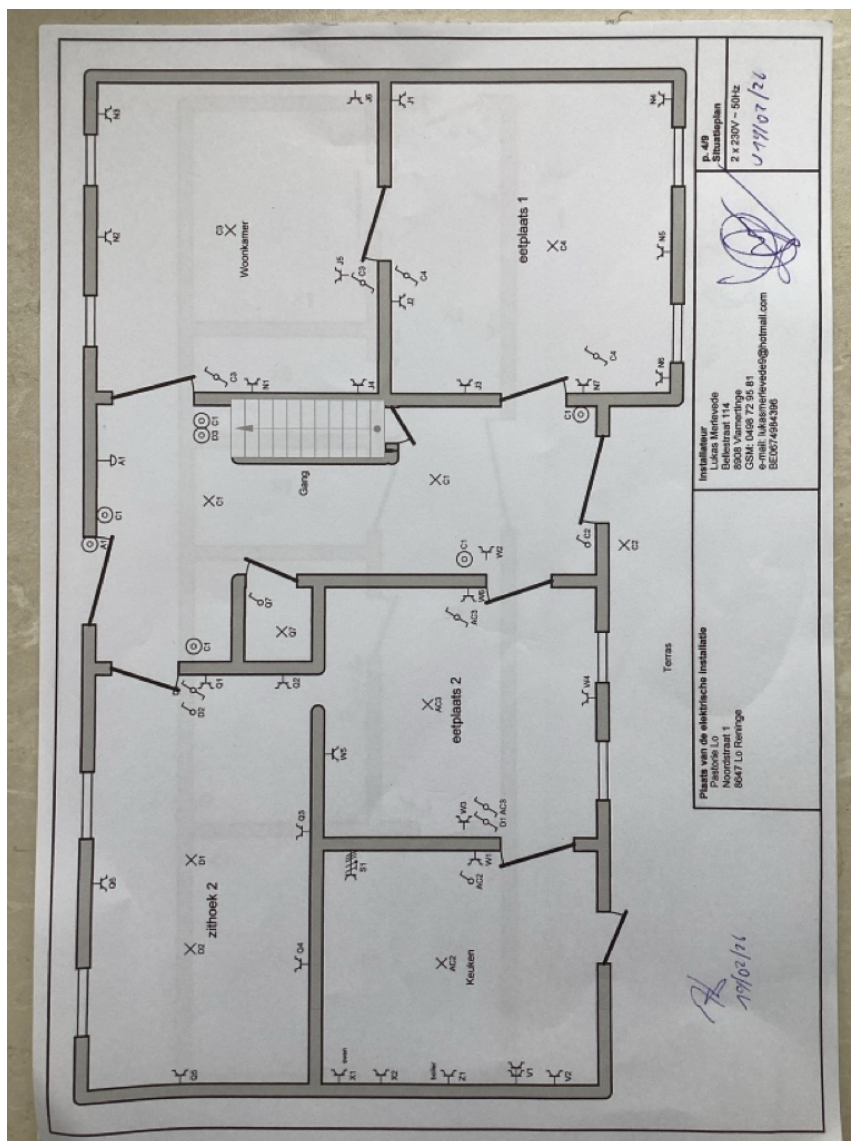


Situatieplannen

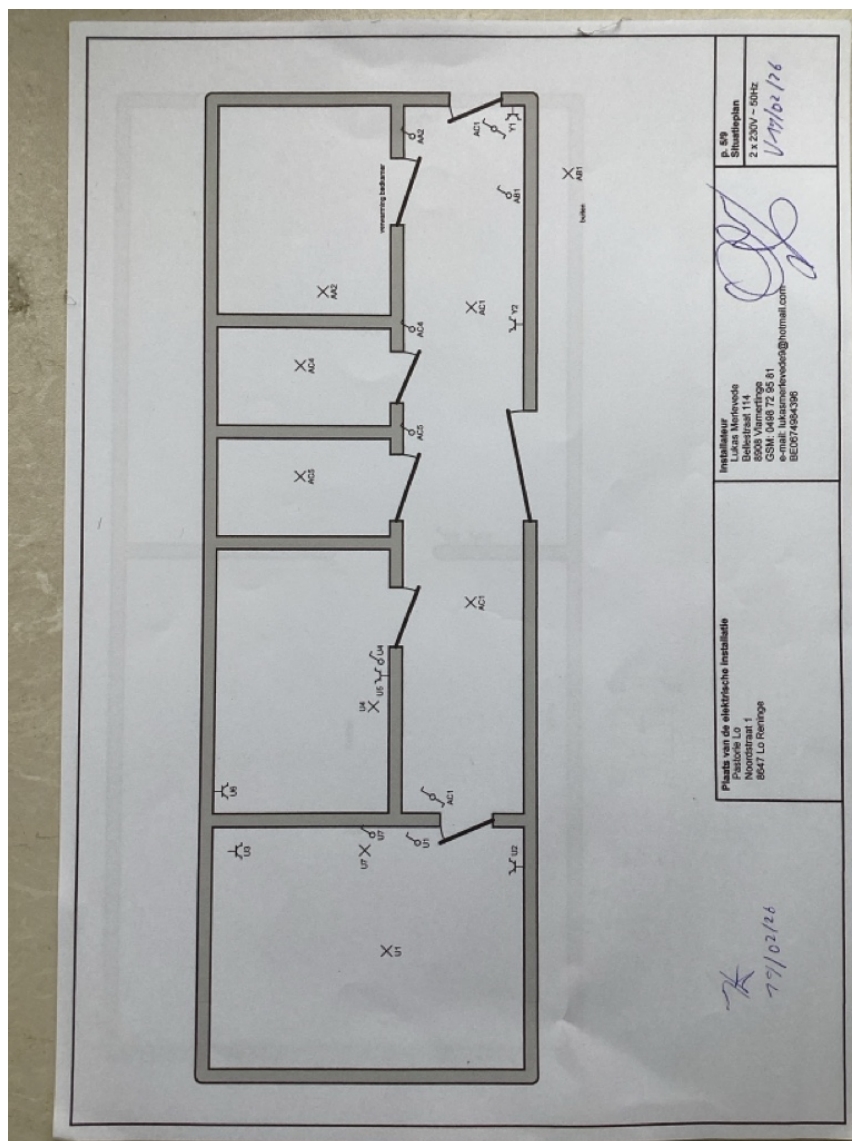


Situatieplannen

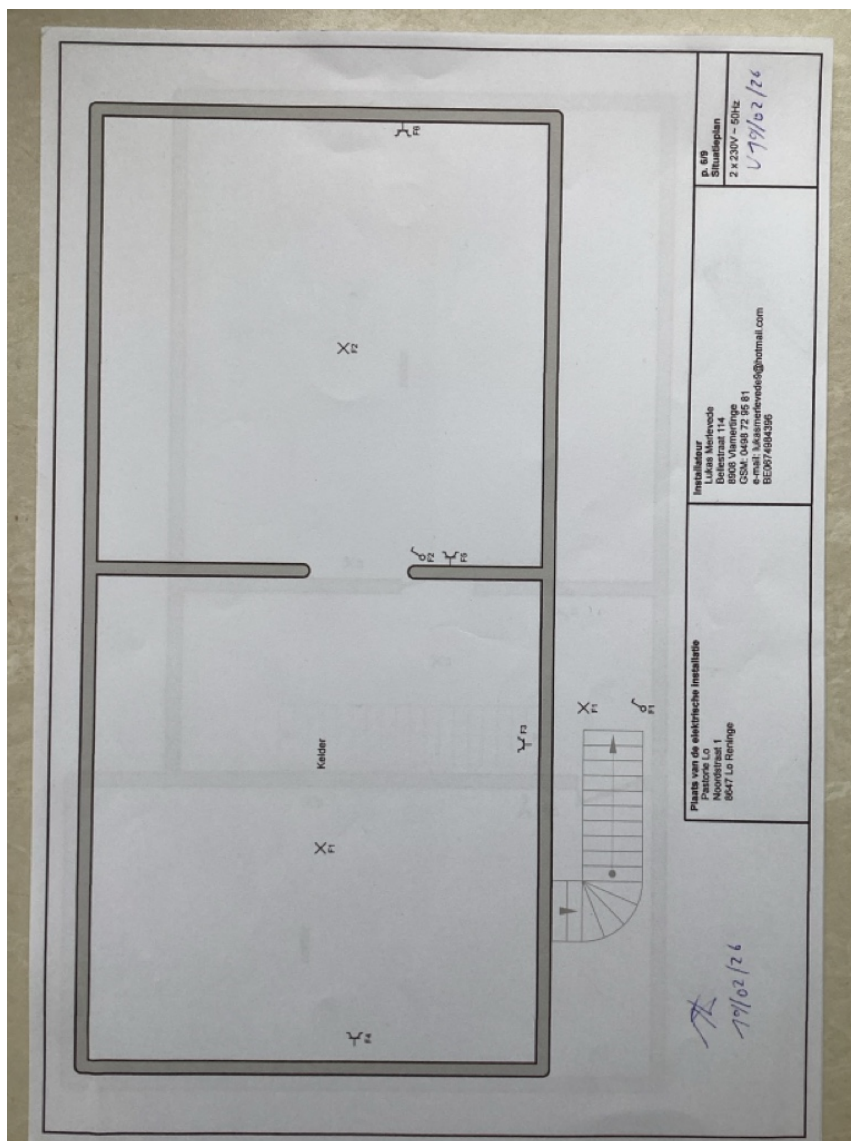

Situatieplannen

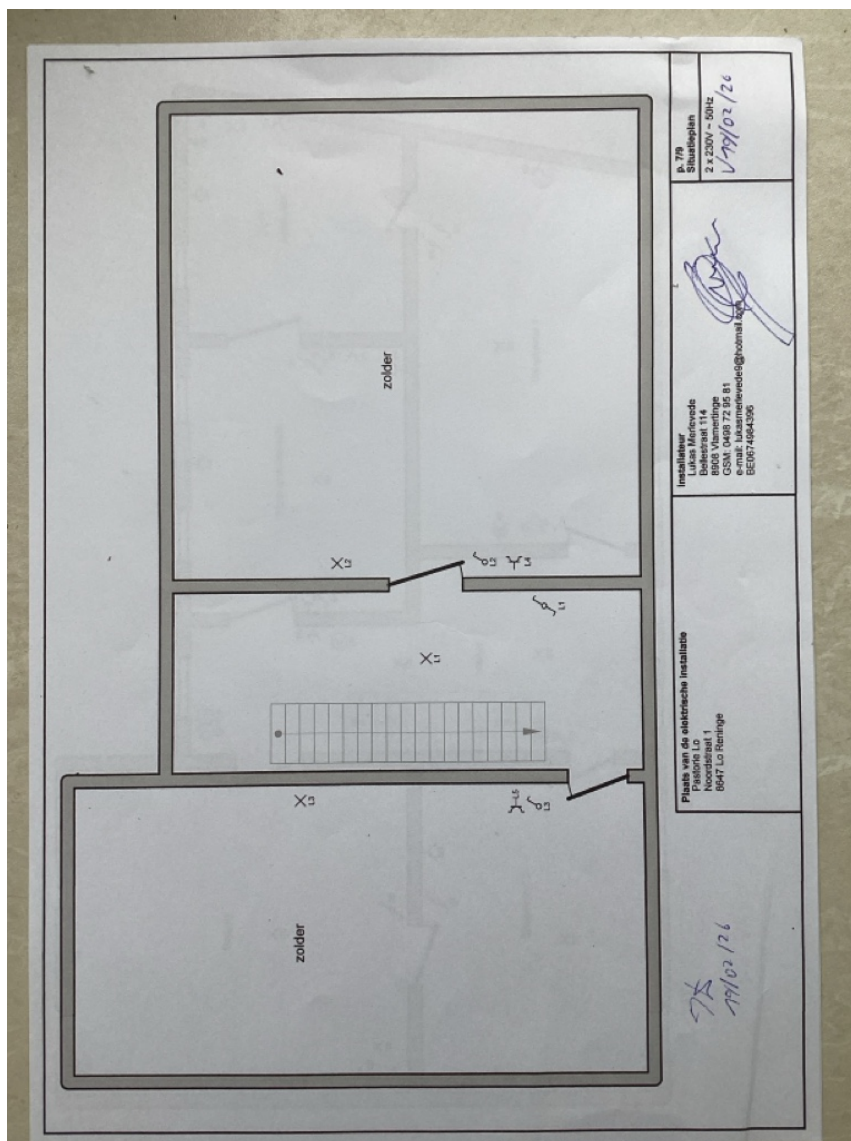

Situatieplannen

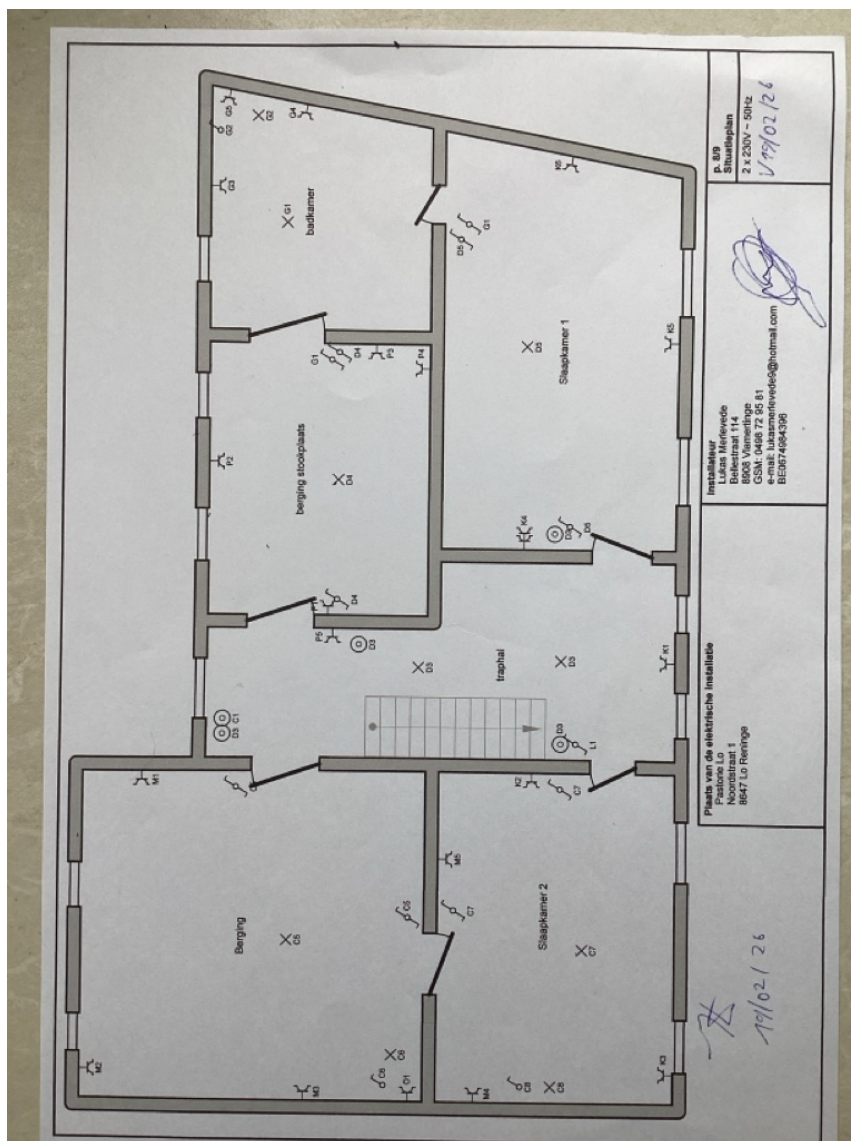

Situatieplannen
